


工事のお知らせ (12月)

[12月の予定]

①	防安地改高第1-3号 橋台工(A1)、護岸工	<ul style="list-style-type: none"> 12月7日(金曜日)仮設道路への切替え工事を行いました。 仮設道路切替え後(12月7日)、橋台の掘削に入ります。 掘削完了後、コンクリート工事に移ります。
②	防安地改高第1号 橋脚工(P1)	<ul style="list-style-type: none"> 大型土のう製作、設置 仮排水路設置 工事用道路、作業ヤード設置、床掘り
③	交防広河第1-2号 護岸工	<ul style="list-style-type: none"> 12月初めに大型土のうの設置を行います。 12月中旬(予定)より護岸の掘削に入ります。 掘削完了後、ブロック積みの施工を行います。
④	30災国河第19号外2件 護岸工	<ul style="list-style-type: none"> 現在施工の計画を行っています。 施工計画完了後、仮設の施工に着手します。

作業位置図

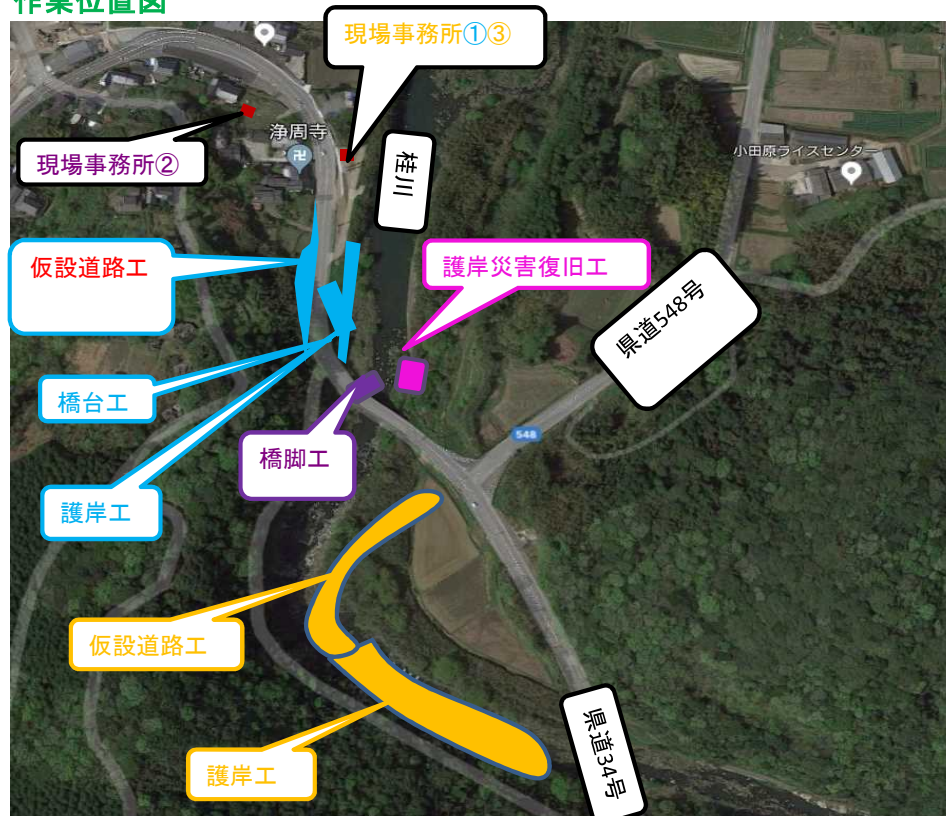

凡例

①	防安地改高第1-3号	橋台工(A1)、護岸工
②	防安地改高第1号	橋脚工(P1)
③	交防広河第1-2号	護岸工
④	30災国河第19号外2件	護岸工

皆様方には工事期間中、ご迷惑をお掛けすると思っております。
安全第一で作業を進めます。宜しくお願い致します。

11月末進捗状況写真

①



②



③



④

